


屋嶋城跡城門北側城壁の解体工事の様

平成 25 年度から屋嶋城跡城門遺構整備事業は城門北側の城壁の修復工事に着手しました。今年度は城壁の解体を実施し、城門北側の城壁構造について調査を行っています。



- ①解体前の状況（城外側）
- ②解体状況
- ③石積み解体後の状況（城外側）
- ④石積み解体後の状況（城内側）
- ⑤石積み背面の状況

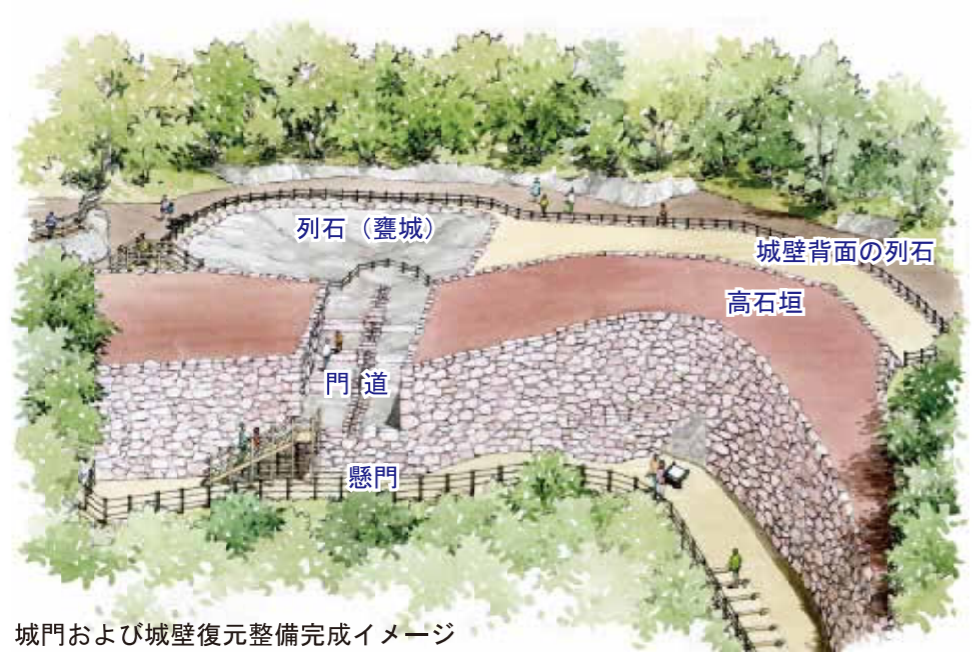

城門および城壁復元整備完成イメージ

第4回 古代山城サミット 高松大会

平成25年 10月4日(金)~10月5日(土)

屋嶋城跡城門遺構整備事業（第4回）現地見学会

日 時 平成 25 年 10 月 6 日 9時から 10時 30分
主 催 高松市

天智六年十一月
是月築倭國高安城
讚吉國山田郡屋嶋城
對馬國金田城



屋嶋山上(屋嶋城跡城門南側城壁)

屋嶋城跡城門南側城壁の修復工事の様相

平成19年度から実施してきた屋嶋城跡城門遺構整備事業はあしかけ6年で城門南側の城壁の修復を終えました。工事が本格的化した20年度以降、転石の回収（平成20年）城壁の解体（平成21～22年）、城壁の試験的施工（平成22年）、城壁の積直し（平成23～24年）を経て、全長35m、高さ6mにおよぶ城壁が往時の姿を取り戻しました。



①石積みへの番付けと墨打ち状況



②解体前の状況



③石積みの解体状況



④石の型取り状況



⑤城壁の試験施工



⑥新石加工状況



⑦丁張り（石積みの勾配）設置状況



⑧石積み状況



⑨飼石等施工状況



⑩築石背面盛土施工状況



⑪旧盛土への酸化マグネシウムの添加



⑫土の含水比等の確認



⑬盛土の撒きだし



⑭背面列石施工状況



⑮盛土の転圧作業



⑯吸出し防止層転圧状況
