

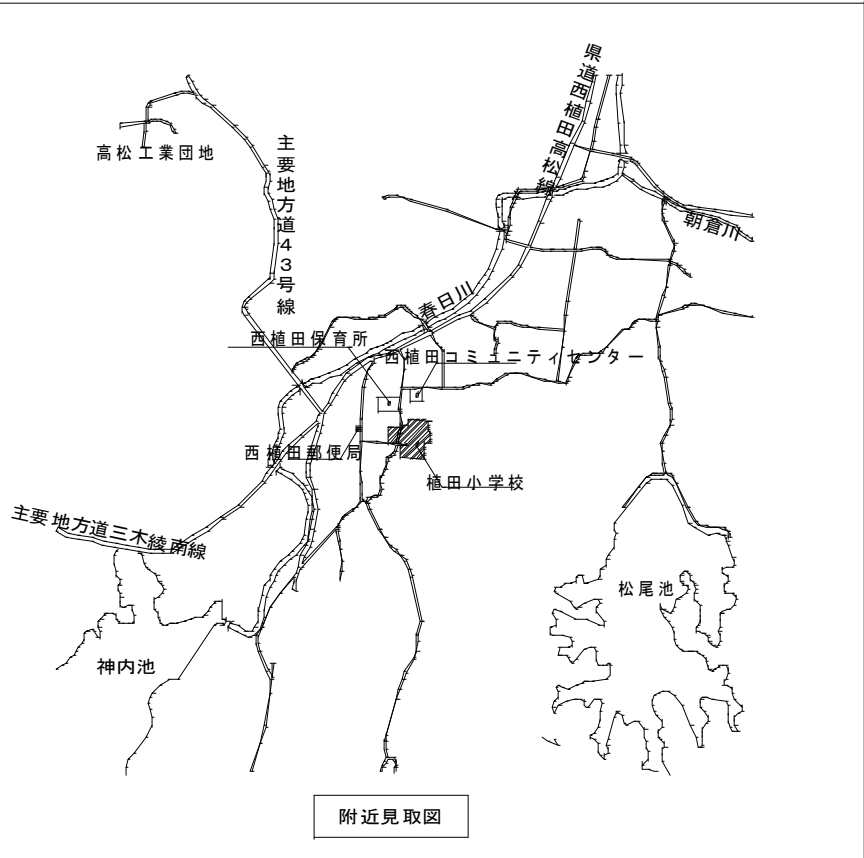





附近見取図

高松市教育局総務課


年度 R 7	工事 名称 図面	植田小学校仮設校舎賃貸借 仮設校舎配置図（参考図）	縮尺 A1:1/250 A3:1/500	図面番号 仮設-01
-----------	----------------	------------------------------	----------------------------	---------------

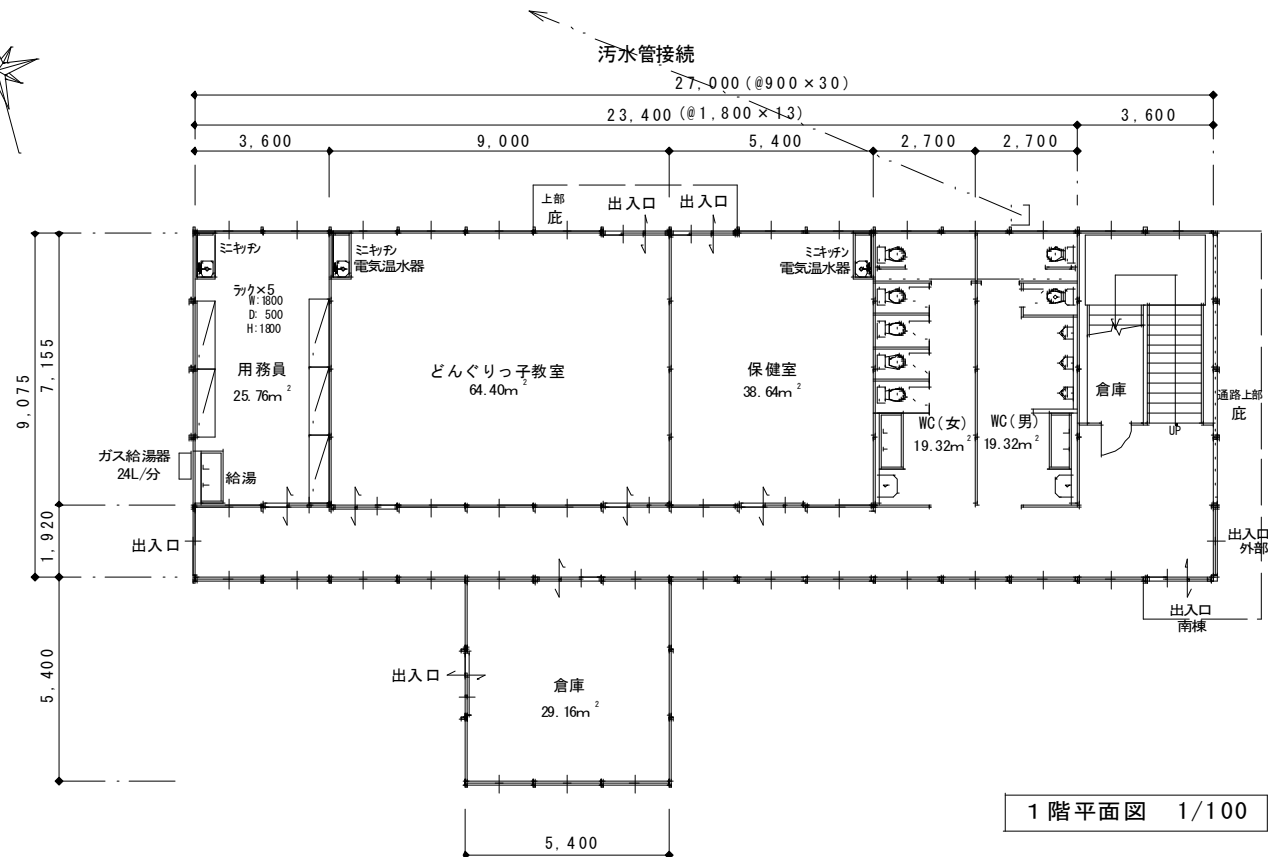

1 階平面図 1/100

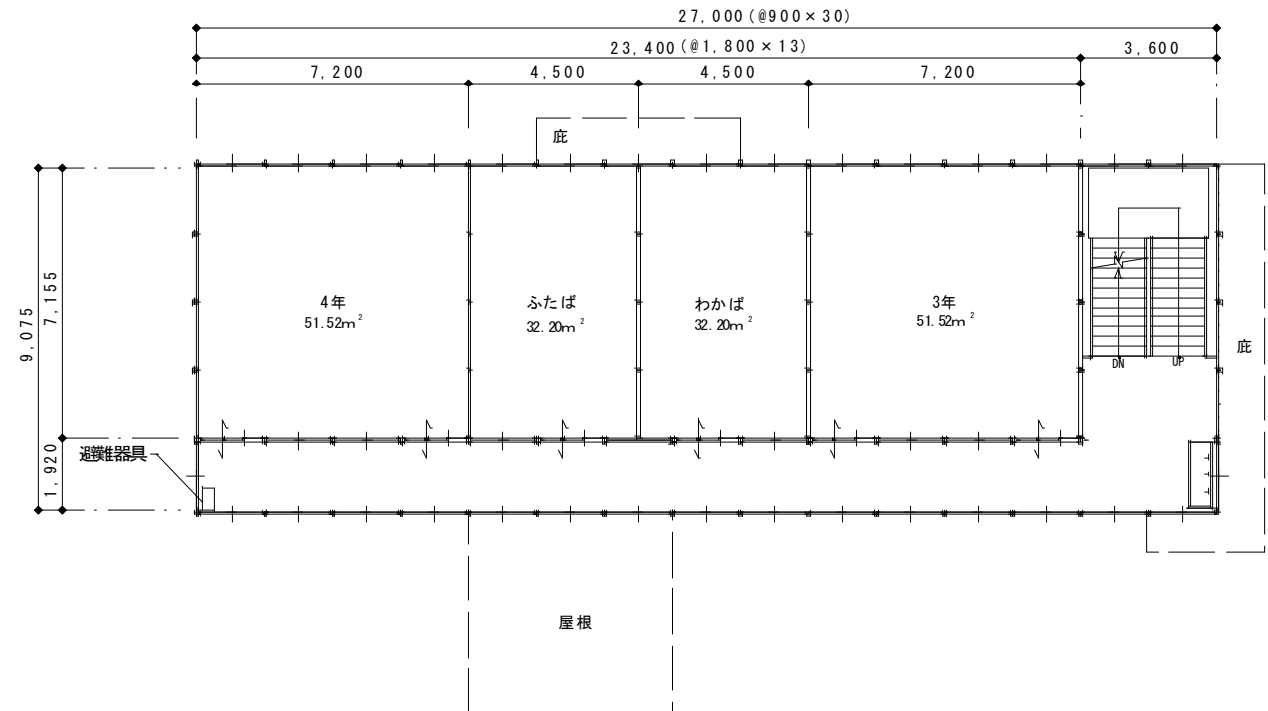


2 階平面図 1/100

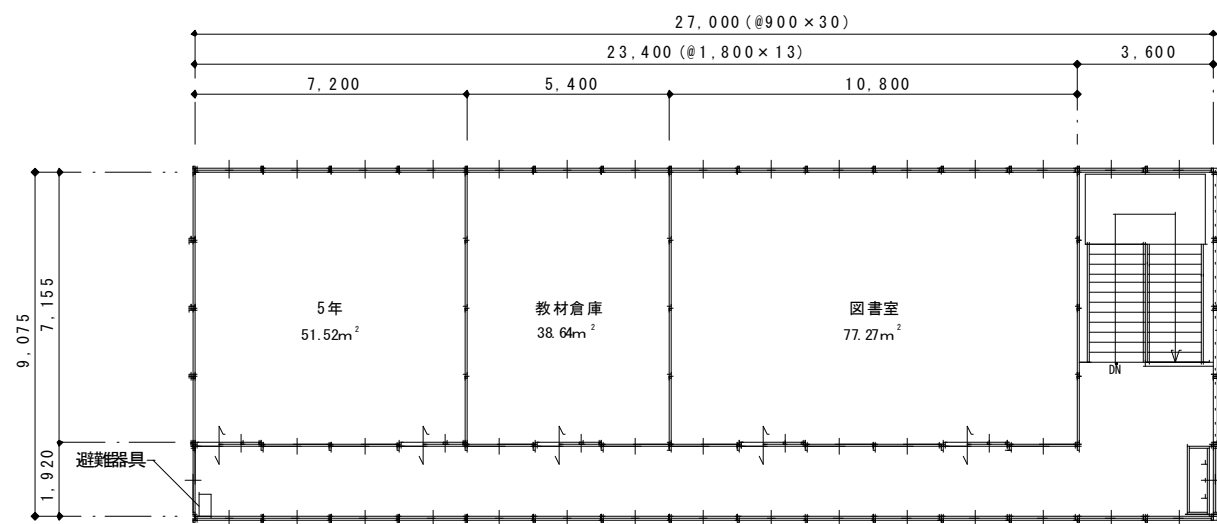

3 階平面図 1/100

普通教室	3
特別支援	2
図書室	1
保健室	1
用務員室	1
どんぐりっ子教室	1
便所	2

仮設校舎面積表	
3階床面積	244.89m ²
2階床面積	244.89m ²
1階床面積	274.05m ²
延床面積	763.83m ²

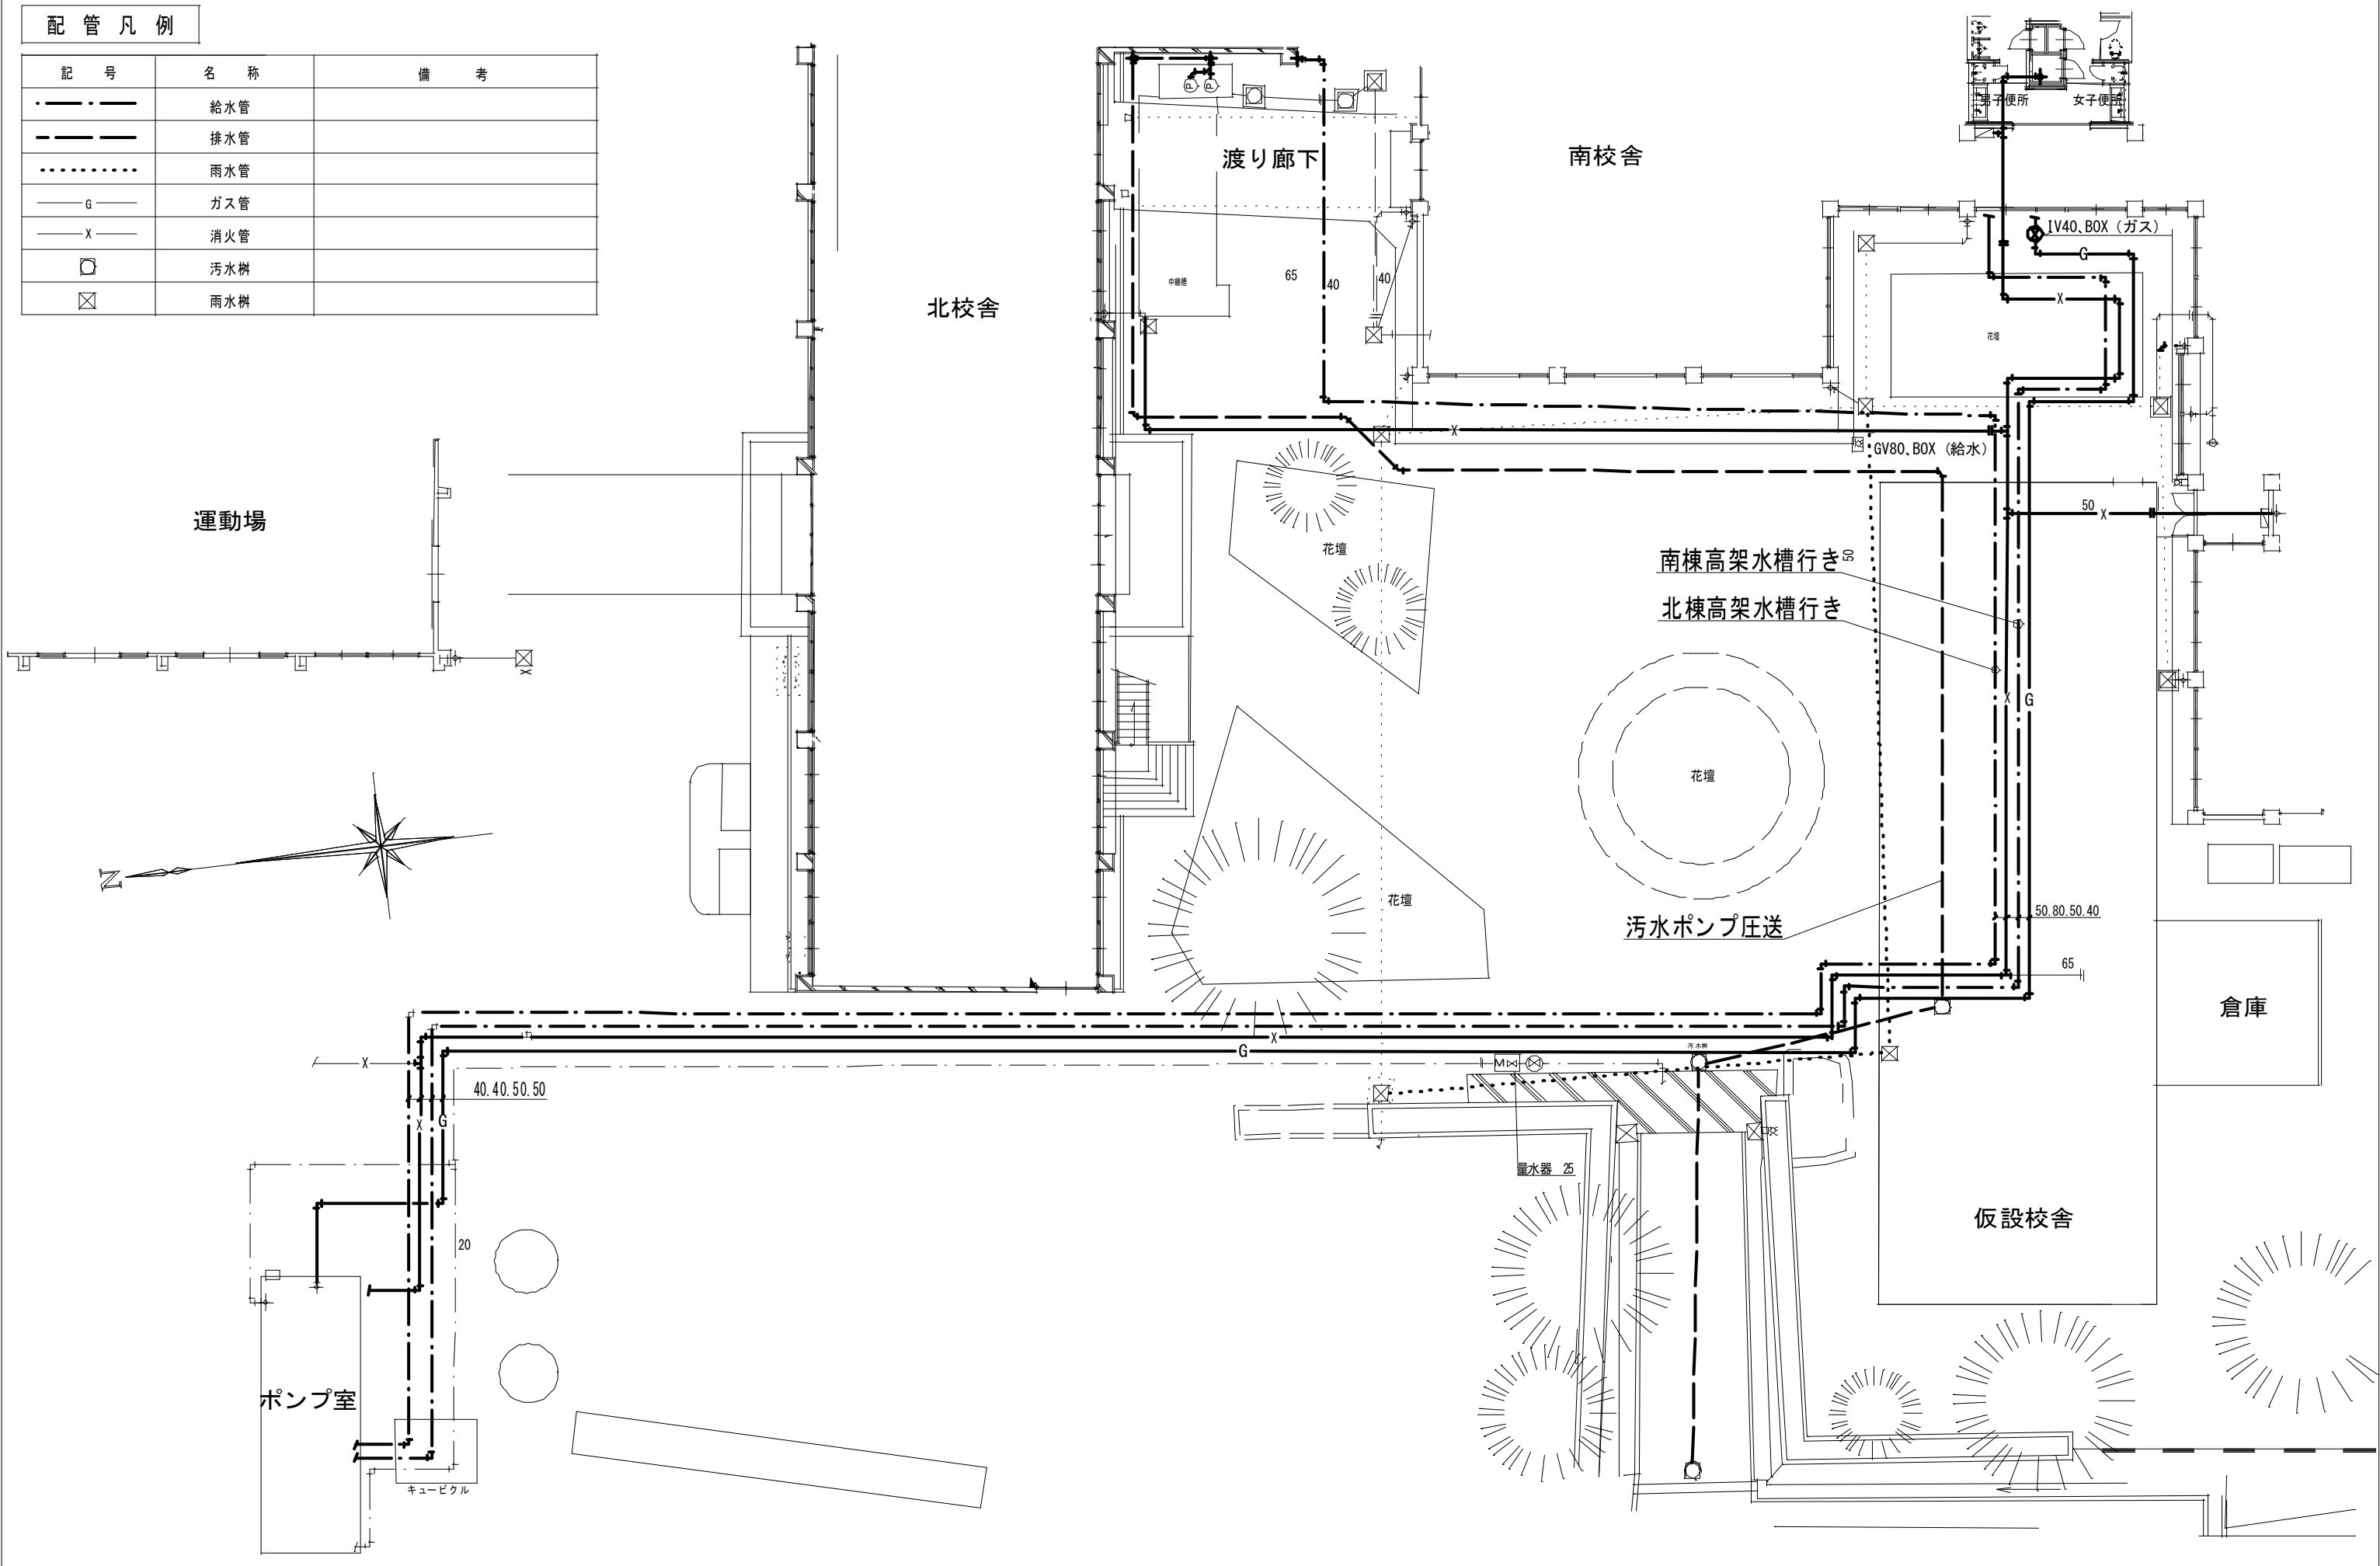



注記

1. 特記なき配管配線のサイズは諸計算によって求めるものとする。
2. 仮設配管配線について、仮設校舎の撤去の際に合わせて撤去とする。

高 松 市 教 育 局 総 務 課

年度
R 7

工事名称 植田小学校仮設校舎賃貸借

図面 仮設校舎 電気 (参考図)

縮尺 A1:1/200
(A3:1/400)



図面番号

假設 - 04

移設リスト

符号	工事内容	詳 細	符号	工事内容	詳 細
Ⓐ	ﾌﾟﾗｲﾌﾞ倉庫	金属製 W1800 H2000 D1800程度	Ⓒ	井水用 手押しポンプ	鋳物製 H800程度 
Ⓑ	石碑	花崗岩 W4700 H1600 D300			

撤去リスト

符号	工事内容	詳 細	符号	工事内容	詳 細
Ⓐ	庭石	花崗岩 W1,000 H800 D600程度 (3カ所)	Ⓙ	飼育小屋	木造 W4,200 D2,100 H2,500程度 屋根：スレート波板 壁：カラー鋼板 基礎：CB積 
Ⓑ	庭石	花崗岩 W1,000 H1500 D400程度			
Ⓒ	庭石	花崗岩 W500 H1,000 D300程度			
Ⓓ	石垣	花崗岩 W500 H500 L=51,000程度 (2カ所) 一部再利用			
Ⓔ	花壇	 RC造花壇撤去	Ⓚ	自転車置場	鉄骨造 W5000 D2000 H2000程度 屋根：スレート波板 土間：コンクリート 
Ⓕ	花壇	 CB造花壇撤去			
Ⓖ	樹木	サクラ H6,000 C400 W6,000 程度 伐根、花崗土埋戻し共	Ⓛ	武道場	鉄骨造 W7800 D9200 H3000程度 屋根：金属波板 壁：カラー鋼板 基礎：CB積 基礎：CB積 床：柔道畳敷き 内部壁 天井：ベニヤ板張り 
Ⓗ	樹木	ソヨゴ H3,000 C300 W2,000 程度 伐根、花崗土埋戻し共			
Ⓘ	植込	ヒラドツツジ 200本程度 盛土流用 (2カ所)			
