

香川地区地域審議会臨時会 配布資料
(平成28年1月8日開催)

高松市南部地域スポーツ施設 (仮称)整備実施設計(案)について

高松市創造都市推進局スポーツ振興課

1 これまでの経緯について

時期	実施内容
平成25年11月	基本構想(案)取りまとめ
平成26年 4月	基本構想(案)の一部変更 (管理棟及び夜間照明は、竣工後の利用状況等を勘案し、整備を検討)
平成26年 6月	基本構想策定
平成27年 1月	実施設計着手

2 整備内容における主な変更点について

基本構想平面図

①

②

③

④

①

- ① 土砂災害、落雷、鳥獣害対策等の安全確保のための整備
- ② 進入路のルート変更及び駐車場、駐輪場の配置変更
- ③ 多目的グラウンド(人工芝)の形状変更
- ④ 天然芝生広場の拡張

3 実施設計(案)の平面図及び利用形態について

【基本構想】

<人工芝エリア(有料)>

- ・サッカー(成年1面・少年2面)
- ・フットサル(4面)
- ・軟式野球
- ・ソフトボール
- ・グラウンドゴルフ
- ・ホッケー 等



【実施設計(案)】

<人工芝エリア(有料)>

- ・サッカー(成年1面・少年2面)
- ・フットサル(4面)
- ・グラウンドゴルフ
- ・ホッケー 等

<天然芝エリア(無料)>

- ・グラウンドゴルフ
- ・イベントスペース 等


【改善策】

・北西角の天然芝のスペースを人工芝に変更することを検討

・バックネット、ピッチャープレート、ベース等の野球関連用具は、できる限り備品で対応も検討



軟式野球・ソフトボールでも使用可能

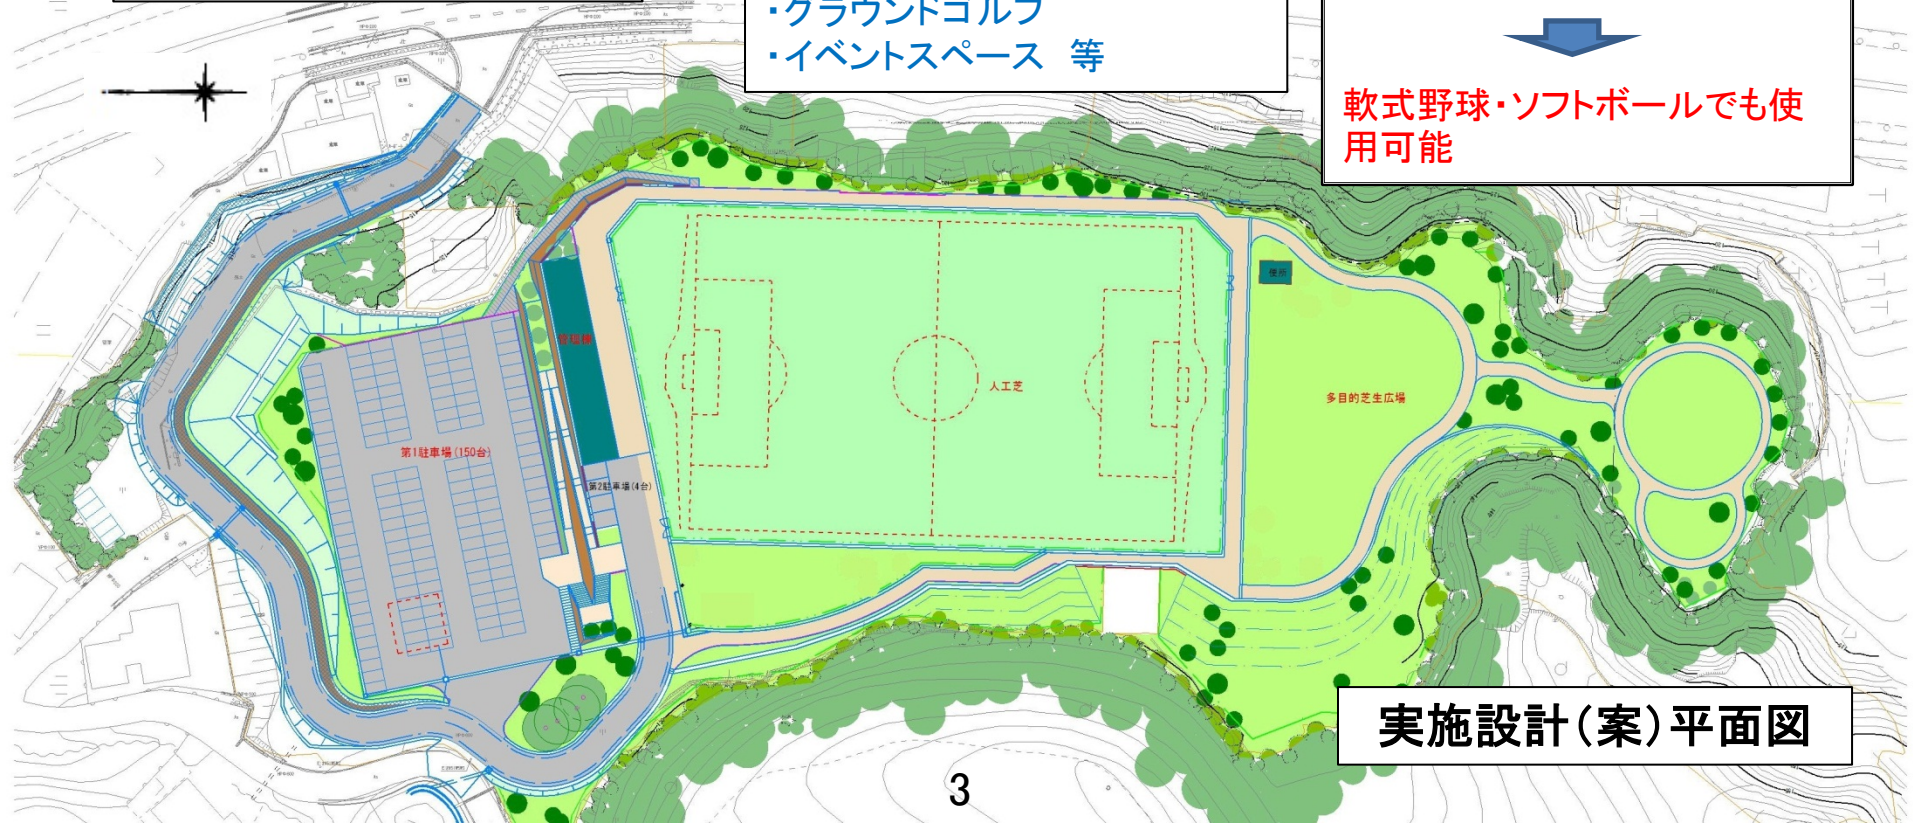

実施設計(案)平面図

4 整備スケジュールについて

【変更前】基本構想時

H25年度	H26年度	H27年度	H28年度
基本構想		設計	建設工事 (H28年度竣工予定)



【変更理由】

土木及び建築関連の設計業務の遅れ

【変更後】実施設計時

H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
基本構想		実施設計		建設工事 (H29年中竣工予定)
